


## Unidad de Gestión del Riesgo

### CALIFICACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS puntos

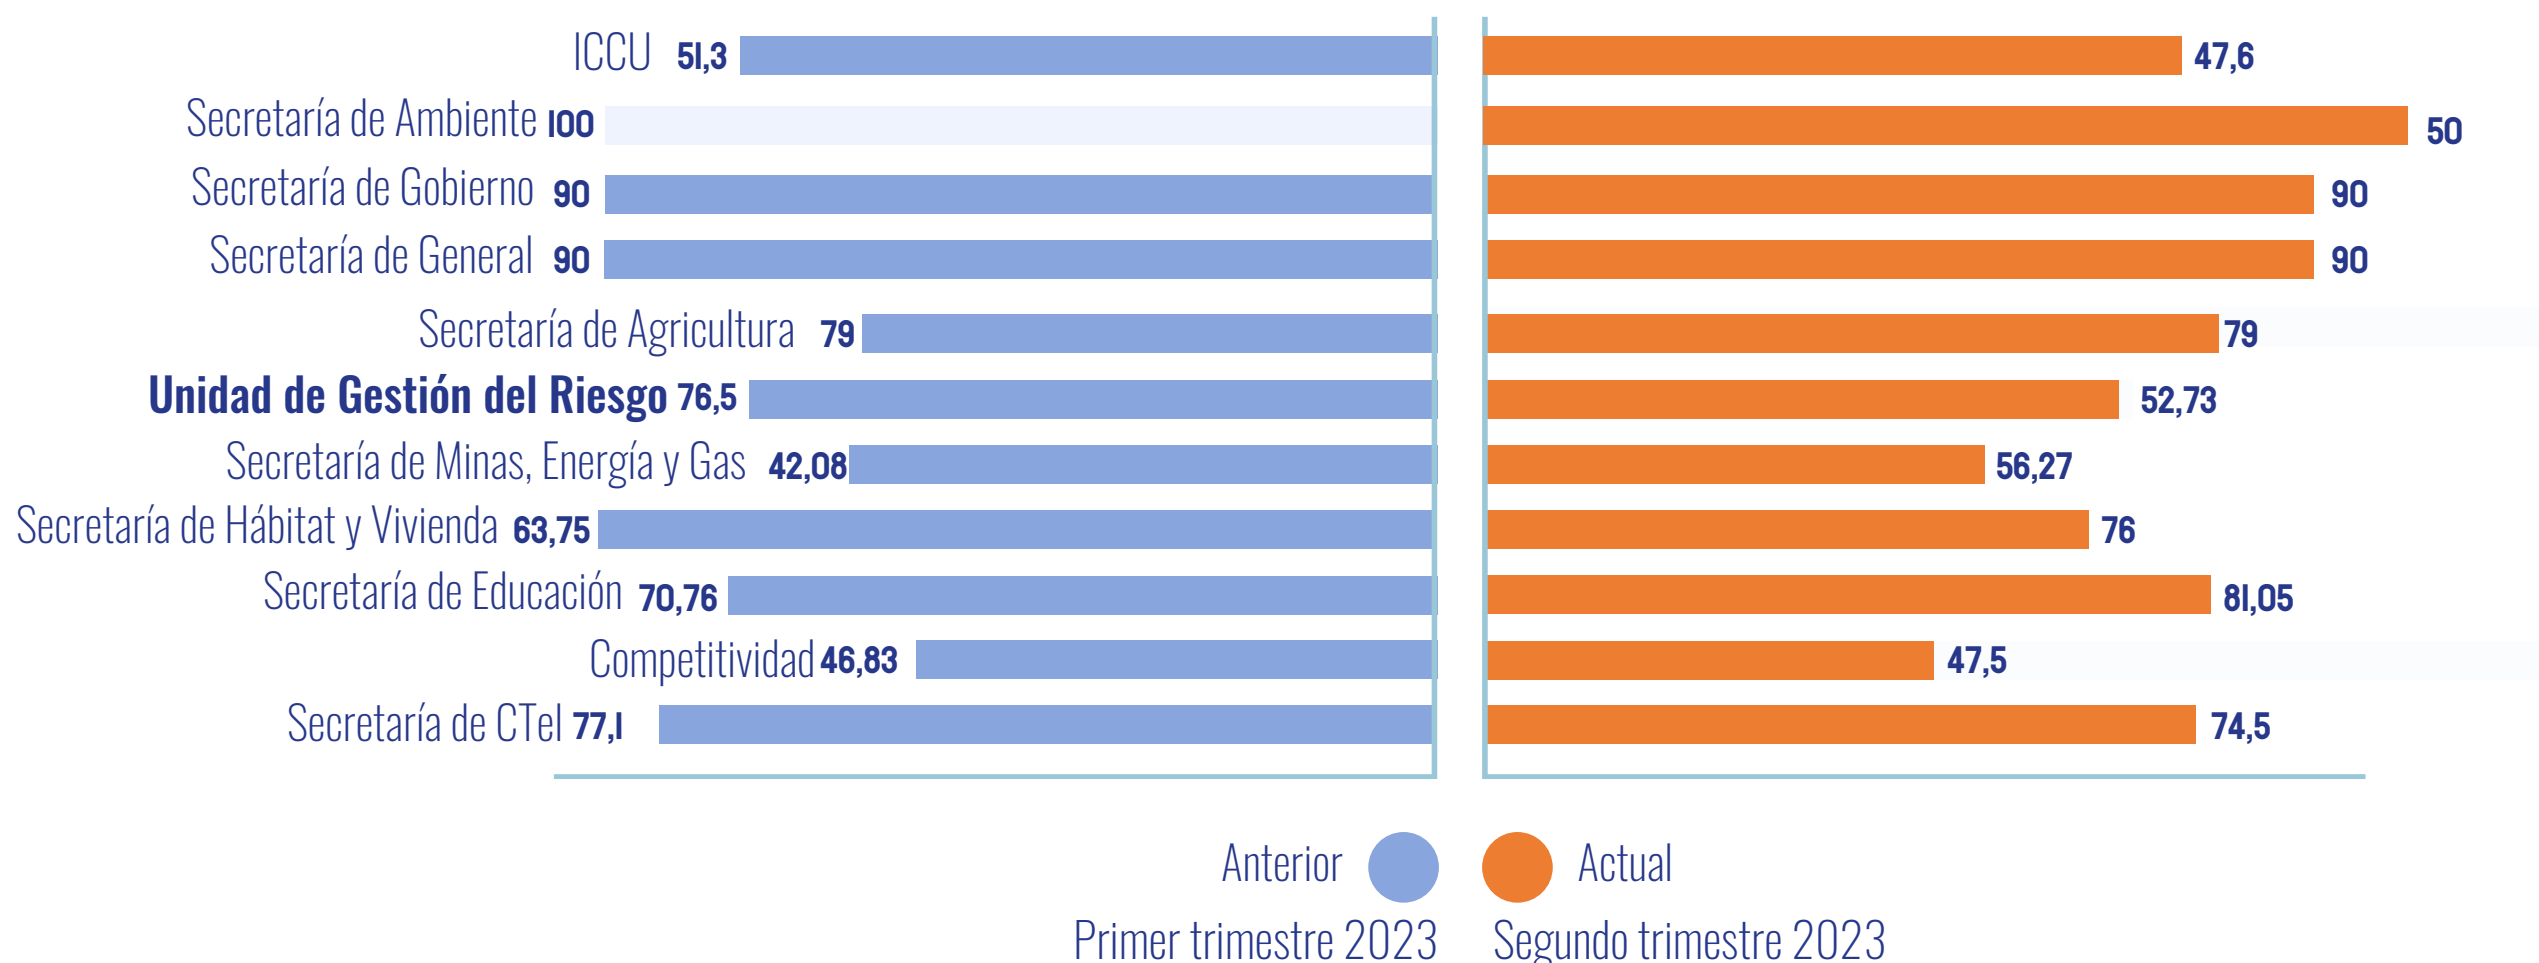

### PROYECTOS A CARGO

de la entidad


▲ Información corte 15 de octubre 2023




Total Proyectos en ejecución

**3**


#### Proyectos pendientes de cierre



#### Proyectos en ajuste




#### En Formulación



Promedio puntaje IGPR

**52,73**  
PUNTOS sobre 100

\*Puntaje anterior 76,50



## Unidad de Gestión del Riesgo

ESTADO	BPIM	Nombre	IGPR
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	20172401060022	Estudios detallados gestión del riesgo Girardot, Ricaurte	50
PARA CIERRE	2021004250690	Fortalecimiento del sistema automotor para la gestión del riesgo de desastres	94,8
SIN CONTRATAR	2022004250031	Construcción de obras para mitigar los riesgos en la zonas aledañas Silvania	13,4

### Proyecto 1



Estudios detallados para la incorporación  
**de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte**

Valor del proyecto SGR  
**\$ 3.084.907.873**

Valor Proyecto  
**\$3.084.907.873**




Código BPIN  
**20172401060022**



Estado  
CONTRATADO EN EJECUCIÓN


#### AVANCE FÍSICO

**20,30%**



#### AVANCE FINANCIERO

**20,27%**



#### Recomendaciones

Este proyecto debe verificar el reporte de ejecución de acuerdo a lo planteado en el aplicativo Gesproy, se deben realizar e informar las gestiones pertinentes referente a la continuidad de la suspensión o reinicio de las obras ya que se está generando una alerta en el aplicativo que puede conllevar a la apertura de un Proceso administrativo por parte del administrador del sistema que es el Departamento Nacional de Planeación. Desde la Dirección de gestión de la Inversión se sugiere que se realicen las gestiones para reiterar a Cormagdalena y a quien corresponda para dar continuidad al avance del proyecto y poder reflejar lo antes posible en el aplicativo el estado actual del proyecto. De esta forma que no siga persistiendo la alerta, adicionalmente completar la información del contratista y supervisores.

### Proyecto 2



Fortalecimiento del sistema automotor  
**para la gestión del riesgo de desastres del departamento de Cundinamarca**

Valor del proyecto SGR  
**\$ 7.299.514.100**

Valor Proyecto  
**\$ 7.299.514.100**



Código BPIN  
**2021004250690**



Estado  
PARA CIERRE



#### Recomendaciones

Este proyecto está en proceso de cierre, se sugiere allegar el acto administrativo de cierre con los soportes y ajustes solicitados por la Dirección de Gestión de la Inversión para revisión y consecución de firma.

#### AVANCE FÍSICO

**100%**



#### AVANCE FINANCIERO

**93,81%**



## Unidad de Gestión del Riesgo

### Proyecto 3



Construcción de obras para mitigar los riesgos que se presentan en la zonas aledañas  
**urbanización Sasipa del municipio de Silvania Cundinamarca**



Código BPIN  
**2022004250031**




Estado  
SIN CONTRATAR



#### Recomendaciones


De acuerdo al aplicativo Gesproy este proyecto presenta alerta por no adelantar procesos precontractuales, por tanto existe riesgo de liberación de recursos. Se sugiere realizar prontamente las gestiones contractuales que requiere el proyecto y de esta forma subsanar las alertas.

#### AVANCE FÍSICO



Valor del proyecto SGR  
**\$ 3.673.954.111**

#### AVANCE FINANCIERO



Valor Proyecto  
**\$3.673.954.111**
